مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة جدة

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

الاستشاري	وكاله التعمير و المشاريع	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الأداره العامه للتنفيذ و الاشراف	شركة طرق الرياض للمقاولات
	اداره تفيذ الطرق	
	مشروع تلال الغروب	تقديم جديد ☑
الاعمال المساحيه و الترابيه	استمارة طلب تسليم رقم	اعادة تقديم ☐

اسم الحي :الامير فواز

رقم المخطط :BLOCK03 رقم الشارع : ROAD 03

استلام الطبقة : 2ND LAYER SUBBASE من محطة رقم :000+0 الى محطة رقم :150+0

اعمال اخرى : ☐

مهندس الموقع :.......................... التاريخ : 6/11/2024 0:00

المراقب ☐ المساح ☐ المختبر ☐ توقيع المهندس المشرف ....

مرئيات المراقبة :

جاهز ☑

غير جاهز ☐

ملاحظات : ....

نتيجة تدقيق المساحة :

من المحطه : 000+0 الي المحطه : 150+0

مرفقات : القطاع الطولي ☐ القطاع العرضي ☐ اخري ☐

متطابق ☑

غير متطابق ☐

ملاحظات : ....

التوقيع: [signature] التاريخ : / /

من محطة : الى محطة :

توقيع المساح : التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد مرفق ☐ غير مرفق ☐ قيمه البركتور : الرطوبه المثلي :

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطة	الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	

النتيجه : ناجح ☐ راسب ☐ التوقيع : .... التاريخ : / /

ملاحظات يلزم ارفاق نتائج اختبار الدمك للتدبس

تعليمات المهندس الاستشاري :

موافق ☑ غير موافق ☐

التوقيع: [signature]

تم الاستلام : .... مندوب المقاول : .... التوقيع : .... التاريخ : / /

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات

تقرير إستلام طبقة ردم


		تلال الغروب	إسم المشروع :-
ROAD-B03-3	رقم الشارع :-	BLOCK03	رقم المخطط :-
264.28M	طول الشارع :-	2nd layer	رقم الطبقة :-
18.000	عرض الشارع :-	LAYAER THICKNESS	0.150
	WIDHT-R 9.000	DEOTH FROM TOP SUB.G	0.000
	WIDHT-L 9.000		

PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L	R		CL width from L	CL width from R
SLOPE				1.50%	-1.50%	0.00%	-1.50%	1.50%		
				5.500	-3.500	0.000	3.500	5.500		
1	0	530077.8212	2369337.831	58.330	58.248	58.300	58.248	58.330	9.000	9.000
2	12.5	530089.3619	2369333.028	58.488	58.406	58.458	58.406	58.488	9.000	9.000
3	25	530100.9026	2369328.226	58.646	58.564	58.616	58.564	58.646	9.000	9.000
4	37.5	530112.4433	2369323.424	58.803	58.721	58.773	58.721	58.803	9.000	9.000
5	50	530123.984	2369318.621	58.957	58.875	58.927	58.875	58.957	9.000	9.000
6	62.5	530135.5247	2369313.819	59.111	59.029	59.081	59.029	59.111	9.000	9.000
7	75	530147.0654	2369309.017	59.266	59.184	59.236	59.184	59.266	9.000	9.000
8	87.5	530158.606	2369304.214	59.420	59.338	59.390	59.338	59.420	9.000	9.000
9	100	530170.1467	2369299.412	59.575	59.493	59.545	59.493	59.575	9.000	9.000
10	112.5	530181.6874	2369294.61	59.729	59.647	59.699	59.647	59.729	9.000	9.000
11	125	530193.2281	2369289.807	59.884	59.802	59.854	59.802	59.884	9.000	9.000
12	137.5	530204.7688	2369285.005	60.039	59.957	60.009	59.957	60.039	9.000	9.000
13	150	530216.3095	2369280.203	60.193	60.111	60.163	60.111	60.193	9.000	9.000

الإستشاري		المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية		شركة طرق الرياض للمقاولات
الإسم :- م/ فاضل محمد		الإسم :-
التوقيع :-		التوقيع :-
التاريخ :-		التاريخ :-





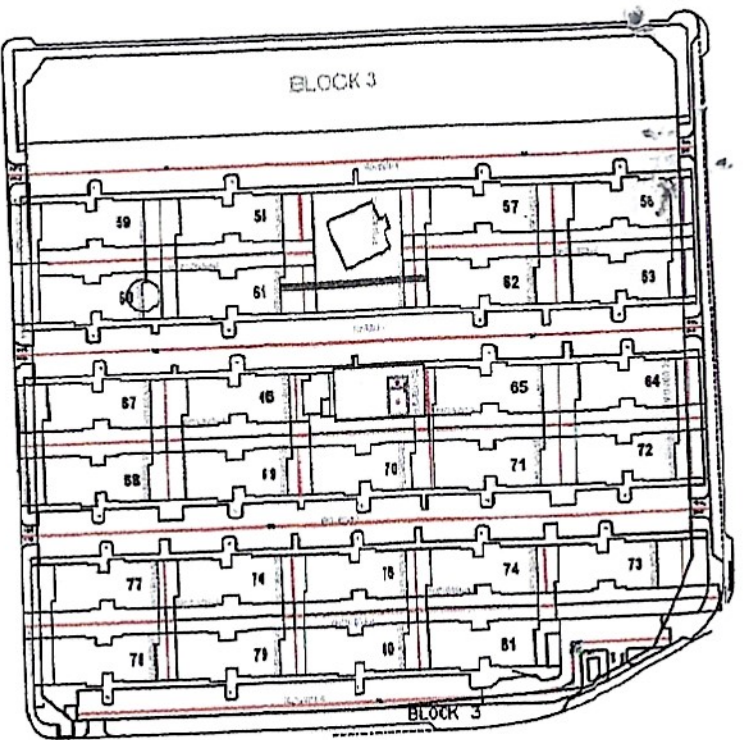

اتجاة تصريف المياة	
الأرض الطبيعية	
الخط التصميمي	
اسفلت قائم	

المملكة العربية السعودية
أمانة مدينة جدة
الادارة العامة للطرق بالادارة
ادارة تصميم الطرق

المالك/ وزارة الاسكان

المطور/ شركة سانى العامرية

الاستشارى العام/ الابنية للاستشارات الهندسية
Abnia Consulting Engineers — Architects . Planners . Engineers

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

تصاميم الطرق لمشروع تلال الغروب بحى الامير فواز شمال - مدينة جدة

BLOCK-03

NO.	3	GENERAL LAYOUT PLAN	1:350

مديرادارة تصميم الطرق — مديرعام الدراسات والتصاميم

BLOCK 3

RO-B03-1 · RO-B03-2 · RO-B03-3 · RO-B03-4

PED-B03-A1 · PED-B03-2 · PED-B03-3

PED-B03-4 · PED-B03-5 · PED-B03-6 · PED-B03-7 · PED-B03-8 · PED-B03-9 · PED-B03-10 · PED-B03-11 · PED-B03-12 · PED-B03-13 · PED-B03-14 · PED-B03-15 · PED-B03-16 · PED-B03-17 · PED-B03-18 · PED-B03-19 · PED-B03-20 · PED-B03-21 · PED-B03-22 · PED-B03-23 · PED-B03-24 · PED-B03-25 · PED-B03-26 · PED-B03-27 · PED-B03-28 · PED-B03-29 · PED-B03-30 · PED-B03-31 · PED-B03-32 · PED-B03-33 · PED-B03-34 · PED-B03-35 · PED-B03-36 · PED-B03-37

START: 0+000.00 ELE: 58.180 RO-B03-1 — END: 0+264 ELE: 60.270 RO-B03-1

START: 0+000.00 ELE: 58.150 RO-B03-2 — END: 0+264.28 ELE: 60.770 RO-B03-2

START: 0+000.00 ELE: 58.250 RO-B03-3 — END: 0+264.28 ELE: 61.620 RO-B03-3

START: 0+000.00 ELE: 58.600 RO-B03-4 — END: 0+240.92 ELE: 62.240 RO-B03-4
